Project Model Canva e Cronograma

PROJECT MODEL CANVA – PLANTECH

POR QUÊ?	O QUÊ?	QUEM?	COMO?	QUANDO? QUANTO?

Justificativa

- Crescimento da demanda por soluções de cultivo inteligente em ambientes urbanos;
- Oferecer facilidade e soluções tecnológicas para aqueles que desejam cultivar hortaliças em ambientes urbanos e com pouco espaço

Produto

- Vasos Automatizados para cultivo indoor;
- Serviço de suporte e personalização das hortas;
- Aplicativo para monitoramento e suporte técnico.

Stakeholders

- Fornecedores;
- Investidores;
- Clientes;
- Patrocinadores.

Premissas

- A demanda por soluções de cultivo inteligente continuará a crescer;
- Parcerias com construtoras serão estabelecidas;
- As tecnologias de automação serão eficazes em melhorar a experiência do usuário.

Riscos

- Escassez de recursos naturais;
- Preocupações com segurança de dados;
- Concorrência de mercado;
- Mudanças nas tendências de tipos de residência.

Objetivo SMART

Lançar a PlanTech no mercado até maio de 2025, alcançando a venda de 10.000 unidades do produto principal nos primeiros três meses, focando exclusivamente nas atividades essenciais ao lançamento.

Requisitos

- Desenvolvimento de sistemas de jardinagem inteligentes e inovadores;
- Utilização de materiais sustentáveis e métodos de produção eco-friendly;
- Criação de uma interface de aplicativo intuitiva e funcional;
- Expansão da presença de mercado em áreas urbanas com interesse em cultivo indoor;
- Oferecimento de recursos educativos e suporte ao cliente para facilitar o uso dos produtos.

Equipe

- Gerentes e líderes de equipe.
- Especialistas técnicos em IA e automação;
- Equipe de desenvolvimento de produto;
- Equipe de marketing e comunicação;
- Funcionários para atendimento ao cliente na loja física.

Grupo de Entrega

- Equipe de desenvolvimento de produto;
- Equipe de marketing;
- Equipe de Tl para desenvolvimento do aplicativo;
- Equipe de atendimento ao cliente

Linha do Tempo

- Definição do Projeto - 150 dias
- Pesquisa e Análise - 75 dias
- Implementação - 168 dias
- Testes e ajustes - 59 dias
- Avaliação e melhorias contínuas - 67 dias

CRONOGRAMA - 378 dias

Benefícios

- Facilitação do cultivo indoor para moradores de áreas urbanas e com pouco espaço;
- Contribuição para práticas sustentáveis e educação ambiental;
- Soluções inovadoras e suporte imediato de acordo com a necessidade de cada horta.

Restrições

- Orçamento limitado;
- Prazo apertado para a implementação;
- Capacidade de produção inicial restrita;
- Flutuações de mercado e econômicas.

Custo

- Definição do Projeto - R$ 90.400
- Pesquisa e Análise - R$ 32.400
- Implementação - R$ 133.250
- Testes e ajustes - R$ 1.500
- Avaliação e melhorias contínuas - 83.250
- Design e Desenvolvimento - 41.000

Por que?

Justificativa

- Crescimento da demanda por soluções de cultivo inteligente em ambientes urbanos
- Oferecer facilidade e soluções tecnológicas para aqueles que desejam cultivar hortaliças em ambientes urbanos e com pouco espaço



Por que?

Objetivo SMART


Lançar a PlanTech no mercado até maio de 2025, alcançando a venda de 10.000 unidades do produto principal nos primeiros três meses, focando exclusivamente nas atividades essenciais ao lançamento.



Por que?

Benefícios

- Facilitação do cultivo indoor para moradores de áreas urbanas e com pouco espaço.
- Contribuição para práticas sustentáveis e educação ambiental.
- Soluções inovadoras e suporte imediato de acordo com a necessidade de cada horta.

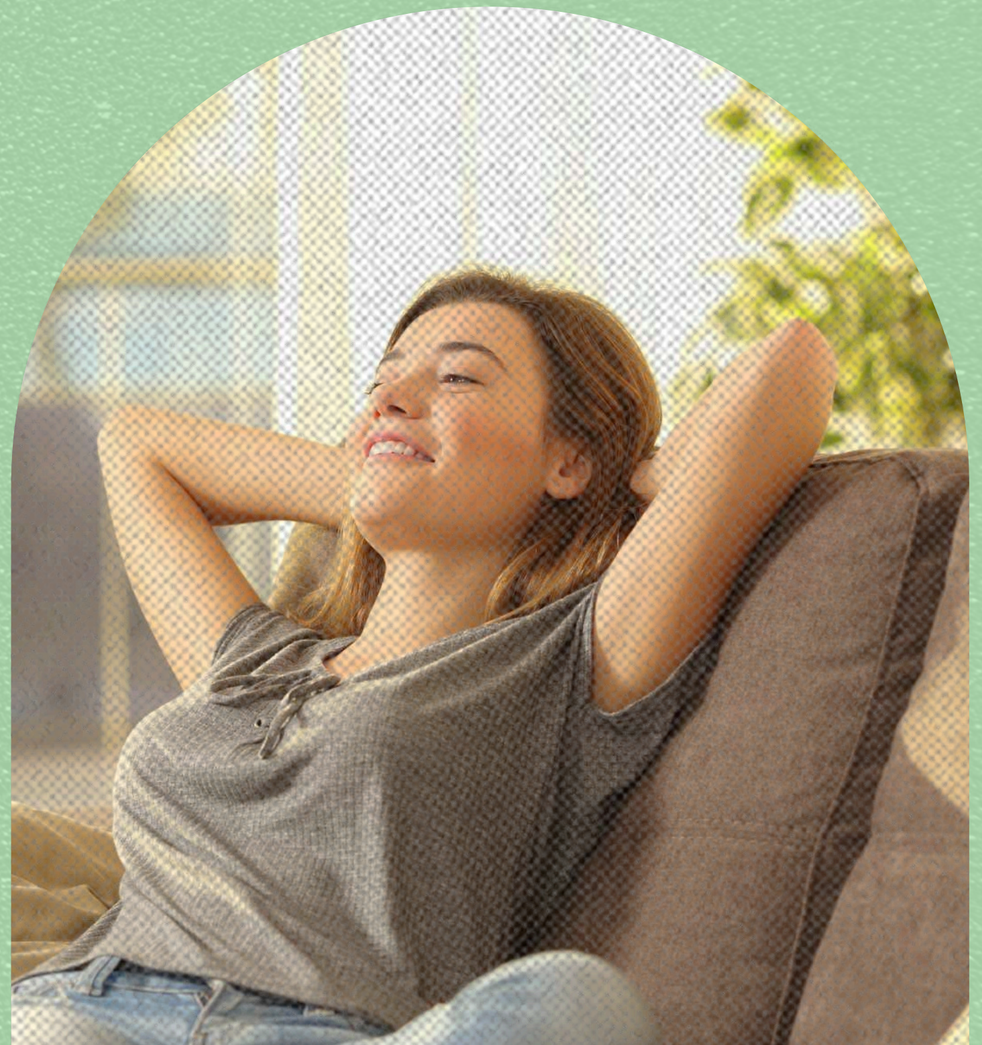

O Que?

Produto





- Vasos Automatizados para cultivo indoor.
- Serviço de suporte e personalização das hortas.
- Aplicativo para monitoramento e suporte técnico.

FATEC Votorantim

PMC PlanTech

O Que?

Requisitos



- Desenvolvimento de sistemas de jardinagem inteligentes e inovadores;
- Utilização de materiais sustentáveis e métodos de produção eco-friendly;
- Criação de uma interface de aplicativo intuitiva e funcional;
- Expansão da presença de mercado em áreas urbanas com interesse em cultivo indoor;
- Oferecimento de recursos educativos e suporte ao cliente para facilitar o uso dos produtos.

Quem?

Stakeholders



- Fornecedores
- Investidores
- Clientes
- Patrocinadores

Quem?

Equipe



- Gerentes e líderes de equipe.
- Especialistas técnicos em IA e automação.
- Equipe de desenvolvimento de produto.
- Equipe de marketing e comunicação.
- Funcionários para atendimento ao cliente na loja física.

Como?

Premissas



- A demanda por soluções de cultivo inteligente continuará a crescer.
- Parcerias com construtoras serão estabelecidas.
- As tecnologias de automação serão eficazes em melhorar a experiência do usuário.

Como?

Grupo de Entrega



- Equipe de desenvolvimento de produto.
- Equipe de marketing.
- Equipe de TI para desenvolvimento do aplicativo.
- Equipe de atendimento ao cliente

Restrições

- Orçamento limitado.
- Prazo apertado para a implementação.
- Capacidade de produção inicial restrita.
- Flutuações de mercado e econômicas.



Quando e Quanto?

Riscos



- Escassez de recursos naturais.
- Preocupações com segurança de dados.
- Concorrência de mercado.
- Mudanças nas tendências de tipos de residência.


Quando e Quanto?

Linha do tempo

- Definição do Projeto - 150 dias
- Pesquisa e Análise - 75 dias
- Implementação - 168 dias
- Testes e ajustes - 59 dias
- Avaliação e melhorias contínuas - 67 dias

Cronograma – 388 dias


	Modo da	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predec
0		0	Cronograma PlanTech	378,67 dias	Dom 17/03/24	Qui 17/04/25	
1		1	Definição do Projeto	150,67 dias	Dom 17/03/24	Qua 21/08/24	
5		2	Pesquisa e Análise	75 dias	Qui 20/06/24	Sex 06/09/24	
11		3	Desing e Desenvolvimento	75 dias	Ter 06/08/24	Qua 23/10/24	
20		4	Implementação	168 dias	Qui 22/08/24	Qui 13/02/25	
38		5	Testes e Ajustes	59 dias	Sex 27/09/24	Qui 28/11/24	
43		6	Avaliação e Melhorias Contínuas	67 dias	Qui 06/02/25	Qui 17/04/25	

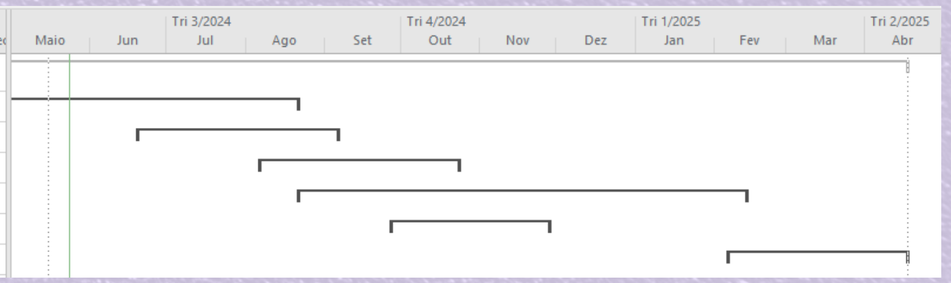

Quando e Quanto?

Custo



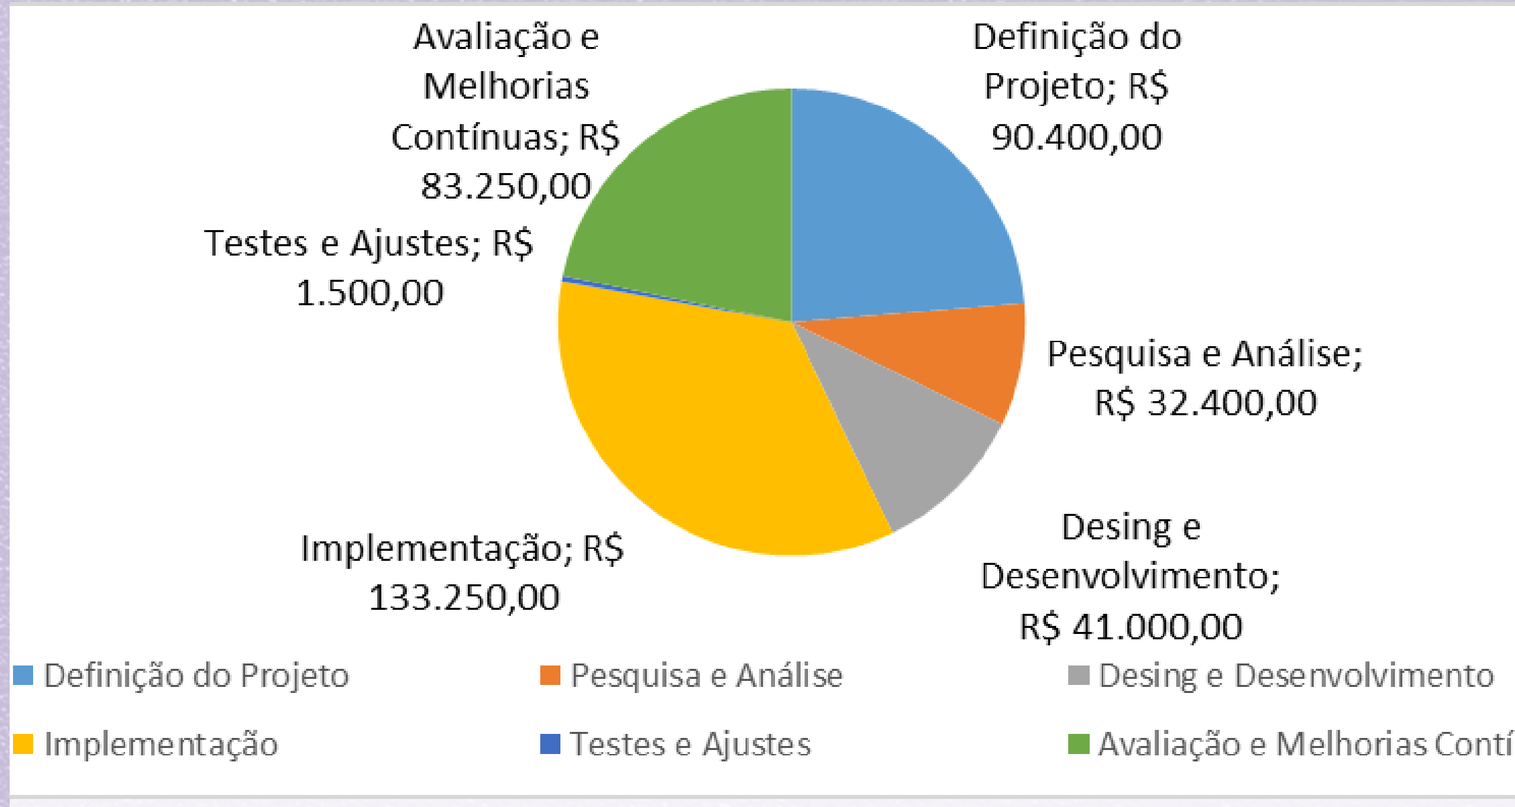

Custo Total - R$ 380 k

FATEC Votorantim

PMC PlanTech

Cronograma

EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecesso
0	**Cronograma PlanTech**	**388,67 dias**	**Dom 17/03/24**	**Ter 29/04/25**	
1	**Definição do Projeto**	**150,67 dias**	Dom 17/03/24	Qua 21/08/24	
1.1	Objetivo principal do projeto e os resultados esperados	90,67 dias	Dom 17/03/24	Qua 19/06/24	
1.2	Desenvolver um plano financeiro detalhado	30 dias	**Qui 20/06/24**	Seg 22/07/24	2
1.3	Garantir financiamento (investidores, empréstimos, etc.)	30 dias	Seg 22/07/24	Qua 21/08/24	3
2	**Pesquisa e Análise**	**75 dias**	**Qui 20/06/24**	**Sex 06/09/24**	
2.1	Estudo detalhado dos dados	15 dias	Qui 20/06/24	Sex 05/07/24	2
2.2	Análise de tendências	15 dias	Sex 05/07/24	Seg 22/07/24	6
2.3	Entrevistas com potenciais clientes	15 dias	Seg 22/07/24	Ter 06/08/24	7
2.4	Estratégia de preços	7 dias	Ter 06/08/24	Ter 13/08/24	8
2.5	Identificação de locais potenciais da empresa e Visitas	15 dias	Qui 22/08/24	Sex 06/09/24	4
3	**Desing e Desenvolvimento**	**60 dias**	**Ter 06/08/24**	**Ter 08/10/24**	
3.1	Desenvolver e Prototipar o produto físico	15 dias	Ter 06/08/24	Qua 21/08/24	8
3.2	Selecionar sementes, mudas e equipamentos necessários	15 dias	Qui 22/08/24	Sex 06/09/24	12
3.3	Planejamento de Mkt	15 dias	Qua 14/08/24	Qui 29/08/24	9
3.4	**Software e desenvolvimento Web**	**45 dias**	**Qui 22/08/24**	**Ter 08/10/24**	**4**
4	**Implementação**	**178 dias**	**Qui 22/08/24**	**Ter 25/02/25**	
4.1	**Obter Licenças e Permissões**	**45 dias**	**Qui 22/08/24**	**Ter 08/10/24**	**4**
4.2	**Planejamento e execução de reformas no Escritório e Fábrica**	**60 dias**	**Sex 06/09/24**	**Sex 08/11/24**	
4.3	Lançamento de campanhas de pré-abertura (teasers, anúncios)	15 dias	Ter 08/10/24	Qua 23/10/24	17
4.4	Parcerias com influenciadores e eventos comunitários	15 dias	Qui 24/10/24	Sex 08/11/24	27
4.5	**Processo seletivo, contratação**	**48 dias**	**Ter 10/12/24**	**Ter 28/01/25**	
4.6	Revisão e testes finais dos sistemas e processos	7 dias	Sex 24/01/25	Sex 31/01/25	41;30
4.7	Formalização de procedimentos operacionais padrão (SOPs)	15 dias	Seg 03/02/25	Ter 18/02/25	34
4.8	Lançamento do Produto	7 dias	Ter 18/02/25	Ter 25/02/25	35
5	**Testes e Ajustes**	**59 dias**	**Ter 08/10/24**	**Seg 09/12/24**	
5.1	Realização dos testes Betas	15 dias	Ter 08/10/24	Qua 23/10/24	12;18
5.2	Coleta de Feedbacks	7 dias	Qui 24/10/24	Qui 31/10/24	38
5.3	Ajustes no Produto e Aplicativo	30 dias	Qui 31/10/24	Seg 02/12/24	39
5.4	Estabelecimento de padrões de qualidade	7 dias	Seg 02/12/24	Seg 09/12/24	40
6	**Avaliação e Melhorias Contínuas**	**67 dias**	**Ter 18/02/25**	**Ter 29/04/25**	
6.1	Estabelecimento de rotinas de manutenção e monitoramento	15 dias	Ter 18/02/25	Qua 05/03/25	35
6.2	**Avaliar o desempenho do projeto**	**60 dias**	**Ter 25/02/25**	**Ter 29/04/25**	**36**
6.3	Continuidade de marketing e relacionamento com clientes	30 dias	Ter 18/02/25	Qui 20/03/25	35

Project

FATEC Votorantim

PMC PlanTech

Obrigado!

